


新庁舎建設だより

～八女市新庁舎建設工事～

2023年7月 No.17
発行：八女市企画部
新庁舎建設課

工事の進捗状況

3階躯体工事（3階柱・壁～4階梁・床）が6月下旬に完了し、現在4階躯体工事を進めています。1階では外部サッシが取り付けられ、内部の壁や設備機器の設置工事などが進められています。2階部分についても型枠やサポート材の撤去が始まっており、7月中旬から内装工事に着手する予定です。

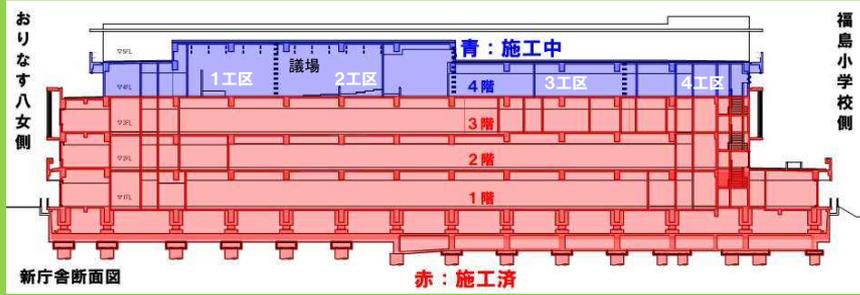

新庁舎棟工事全景（令和5年6月27日 市役所敷地上空 既存庁舎側より）



1階 外部サッシが取り付けられました。作業でキズが入らないように養生されています。



1階 待合ホール～窓口カウンター部：柱の少ない広い空間を確保しています。



1階 内装仕上げの前に、様々な配管や配線、設備が設置されています。



1階 空調や換気などの機器の設置も始まりました。



1階 内部の壁も工事が進んでいます。軽量鉄骨の下地に石膏ボードを貼って壁を作ります。



1階 遮音性が求められる部屋には、壁の内部にグラスウールを敷き詰めます。



2階 大量の型枠・サポート材の撤去が始まりました。7月中旬から内装工事に入ります。



4階 1工区は5階床の型枠まで工事が進みました。奥の足場は現場で天井が高い部分です。



2階(免震階) 配管や配線、空調のダクトなどが立体的に交差され設置されています。

7月の工事予定

※ ●：コンクリート打設日(予定)
※ 現場全休日：日曜日



大型車両の往来や工事の騒音等で大変ご迷惑おかけします。

工事内容	階数	予定期間
躯体工事	4階	7月1日 - 7月25日
	5階	7月15日 - 7月25日
内装工事	1階	7月15日 - 7月25日
	2階	7月15日 - 7月25日
外装工事		7月15日 - 7月25日
設備配管配線工事		7月15日 - 7月25日

問い合わせ：新庁舎建設課：0943-24-8091
工事現場事務所：0943-24-8650(施工業者：東急・イノエビルディング JV)
