



新庁舎建設だより

～八女市新庁舎建設工事～

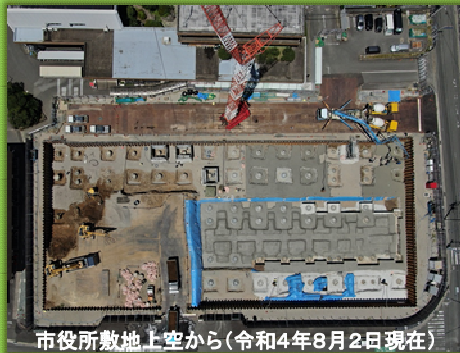

2022年8月 No.6
発行：八女市企画部
新庁舎建設課

工事の進捗状況

7月に入り杭工事が完了し、掘削工事が始まりました。大量の土砂の搬出のため、1日計90台程度的大型ダンプが出入りしています。出入口に誘導員を配置し安全を最優先に進めていますので、大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力よろしくお願いいたします。



おこなす八女屋上から(令和4年8月1日現在)



市役所敷地上空から(令和4年8月2日現在)



約70m

これから工事で大活躍する大型クレーンが設置されたよ。この状態でも先端までの高さが70mを超えるんだって。大きいね～。

既存庁舎

今月の工事予定

※8月6日(土)、20(土)作業日、12日～16日全休。
※コンクリート打設日：1日50～80台のミキサー車が往来します。

8月	第1週	第2週	第3週	第4週	第5週
掘削工事					
杭頭処理工事					
基礎工事(鉄筋)					
基礎工事(コンクリート)					
地中熱設備工事					

問い合わせ：新庁舎建設課：0943-24-8091

工事現場事務所：0943-24-8650(施工業者：東急・イワハワグ JV)

◆掘削工事

免震装置や雨水再利用用貯留槽などを設置する地下部分を構築するため、地面を約5m程度掘り下げています。掘削全量約10,800m³をバックホウ3台(0.7m³×2台、0.25m³)で掘り進めており、7月末現在で約7割の掘削が完了しています。



約5m

◆杭頭処理工事

場所打ちコンクリート杭の頭部には、不純物が混ざり品質が低下する可能性があるため、それを想定し余分にコンクリートを打設(今回は80cm)します。コンクリートが固まった後、掘削し杭頭部をあらわして、余盛部分を解体する作業をおこないます。防音シートで囲むなど騒音対策を行って作業を進めています。



杭頭処理(前)



杭頭処理(後)



杭頭処理状況



防音シート
