

# 新庁舎建設だより

## ～八女市新庁舎建設工事～

2023年1月 No.11  
発行:八女市企画部  
新庁舎建設課

### ◆免震装置上から1階床までの工事

### 🚧 工事の進捗状況 🚧



12月は免震層（地下部分）の基礎や梁及び1階床までの鉄筋や型枠の組立を5工区に分けて進めてきました。1工区（おりなす側）は外側の型枠が組み立てられ、完成時の1階床の高さが分かる状況となっています。1工区のコンクリート打設を1月上旬に予定しており、引き続き2工区以降の鉄筋型枠の組立を行い、コンクリート打設を行っていく予定です。

また、敷地北側（旧442号線側）で施工していた地中熱設備工事の内、令和4年度に実施する工事が12月下旬に完了しました。今後、臨時駐車場（来庁者及び現場作業員用）として利用するための整備を進めていく予定です。

今年も安全最優先で作業を進めてまいります。騒音、振動、大型車の往来などで大変ご迷惑おかけしていますが、引き続きご理解ご協力よろしくお願いいたします。



市役所敷地上空から（令和5年1月6日現在）

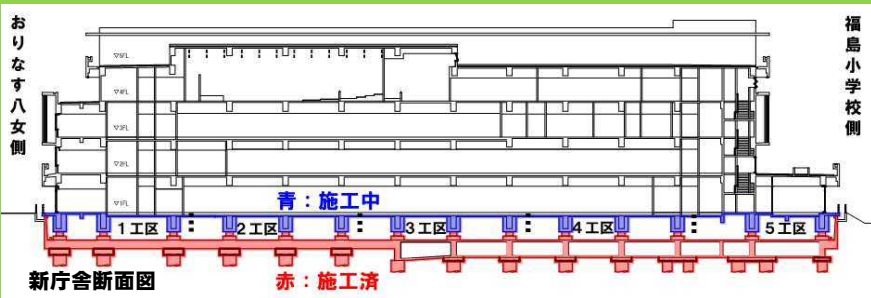

免震装置上基礎



免震装置上の基礎同士を梁でつなぎます。



1階の床（梁と梁の間）の下に断熱材を敷き込みます。



おりなす

1工区の状況（1月4日現在）



断熱材（ポリスチレンフォーム30mm・型枠兼用）敷き込み状況



断熱材の上に1階床の鉄筋を組んでいます。

ここが、新庁舎の1階の床の高さなんだって。建てる前の駐車場だった時の高さに合わせて計画されているようだよ。おりなす側の角の透明パネルから中が覗けるので近くを通るときは確認してみてね。



### 🚧 1月の工事予定 🚧

※●：コンクリート打設日（予定）  
※1月7.14.21.28日は作業日となります。

免震上基礎工事	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1階躯体工事											
仮設工事（外部足場）											

問い合わせ：新庁舎建設課：0943-24-8091  
工事現場事務所：0943-24-8650（施工業者：東急・イケアパブリックJV）
