# 新庁舎建設だより
## ～八女市新庁舎建設工事～

2023年6月　No.16
発行：八女市企画部
新庁舎建設課

## 工事の進捗状況

2階躯体工事が完了し、現在3階躯体工事（3階柱・壁～4階梁・床）を進めています。地下の免震層では、コンクリート打設に使用した大量の型枠やサポート材が撤去され、きれいに片付けられた後に設備の配管や配線工事が始まっています。

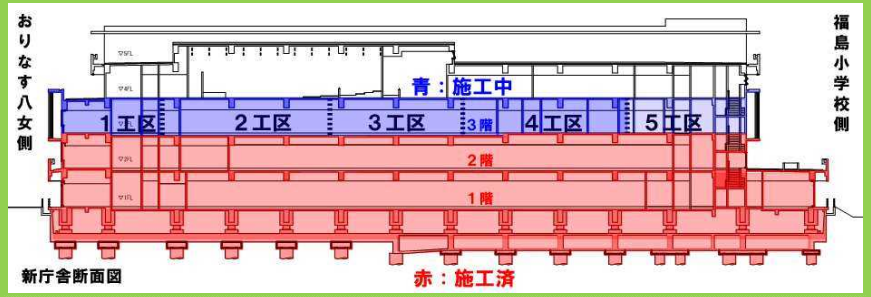

新庁舎断面図

新庁舎棟工事全景（令和5年5月29日　市役所敷地上空より）

地下（免震階）：型枠とサポート材が撤去され、きれいに片付けられました。



地下（免震階）では、片付後に、設備用の配管や配線などが施工されています。

地階～1階フロアの階段部も型枠等が撤去され、通行が可能になりました。

1階：西半分は、PC鋼線緊張（3階梁）が終わったため、型枠・サポート材が解体されました。

1階：東半分のサポート材等も6月初旬には解体撤去し、1階フロアは次の工程に進みます。

2階：大量のサポート材で躯体を支えています。撤去は、6月末から順次行っていく予定です。

3階躯体（1～3工区）：4階梁・床の型枠が設置され、鉄筋工事を行っています。

3階躯体（4～5工区）：柱・壁の鉄筋工事後に型枠が設置され、左の工事へ進んでいきます。

おりなす八女側に、資材搬入・搬出のための工事用エレベーターが設置されました。

## 6月の工事予定

※●：コンクリート打設日（予定）
※ 現場全休日：日曜日




問い合わせ：新庁舎建設課：0943-24-8091
工事現場事務所：0943-24-8650（施工業者：東急・イノウエハウジングJV）
