新庁舎建設だより
～八女市新庁舎建設工事～

2022年10月 No.8
発行:八女市企画部
新庁舎建設課

工事の進捗状況

先月に続き基礎工事を行っています。現在免震装置を設置する階層の床（※ﾏｯﾄｽﾗﾌﾞ：下図青点線囲み）の工事を進めており、9月末現在で1工区のｺﾝｸﾘｰﾄ打設が完了しています。（※下図赤着色部）

今月は2週目からﾏｯﾄｽﾗﾌﾞの2～9工区のｺﾝｸﾘｰﾄ打設を行います。1日を通してﾐｷｻｰ車が往来し、大変ご迷惑をおかけしますが、誘導員を配置し安全を最優先に進めますので、ご理解ご協力よろしくお願いいたします。

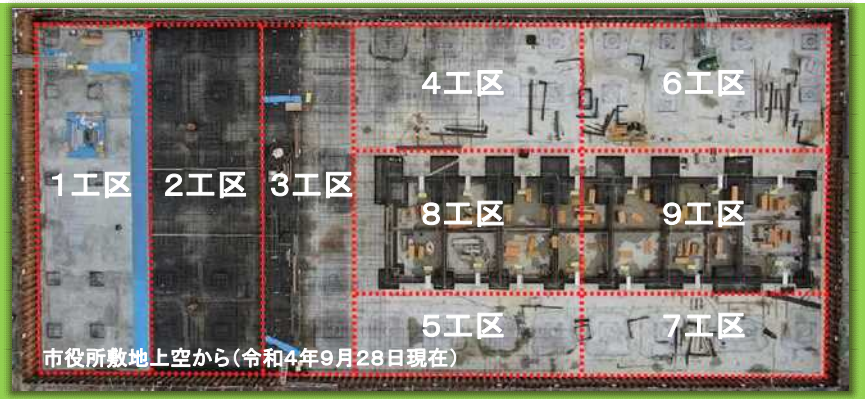

市役所敷地上空から（令和4年9月28日現在）

◆基礎工事（マットスラブ）

新庁舎の基礎はﾏｯﾄｽﾗﾌﾞという基礎形式を採用しています。これは、柱ごとの独立した基礎や地中梁を設けず、建物の平面全体に厚さの大きいｽﾗﾌﾞ（床）を設置し、全体を基礎とする工法です。新庁舎のﾏｯﾄｽﾗﾌﾞは厚さが約1mあり、必要とするｺﾝｸﾘｰﾄ量も多いため、一日で打設できる量を計算し、9つの工区に分けて工事を進めています。

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設前

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設状況

1工区ｺﾝｸﾘｰﾄ打設完了

土間仕上工具:ﾄﾛｳｪﾙ

土間仕上状況

1工区ｺﾝｸﾘｰﾄ打設完了

『トロウェル？？』
ｺﾝｸﾘｰﾄ床面を平たんに仕上げる機械だって。ｺﾝｸﾘｰﾄが固まりだしてから、左官さんが機械の先についたﾌﾟﾛﾍﾟﾗのようなものを回転させて床を擦りあげてきれいに平らにしていたよ。すごいね～

今月の工事予定

10月の主な工事予定
※●：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設日（予定）
※10月15日（土）、22（土）は工程の都合により、作業日（予定）となります。



問い合わせ:新庁舎建設課:0943-24-8091
工事現場事務所:0943-24-8650（施工業者:東急・ｲﾉｳｴﾊｳｼﾞﾝｸﾞJV）
